


APPEL A CANDIDATURES (Initiative de l'ADER)

Phase	Etape	Actions	Durée approximative	Responsable
SELECTION OPERATEUR		<i>Si APD non disponible => Etape 01</i>		
		<i>Si APD disponible => Etape 06</i>		
	01	Etude de reconnaissance		ADER
	02	Elaboration du cahier des charges pour l'étude APD	10 jours	ADER
	03	Lancement de l'appel d'offres de l'APD	01	ADER/ARMP/Partenaires
	04	Réalisation de l'étude APD	30-60 jours	Bureau d'études
	05	Validation de l'étude (technique et financière)	15-30 jours	ADER
	06	Elaboration du dossier d'appel à candidatures à partir des résultats de l'APD	5-10 jours	ADER
	07	Envoi du DAC à ORE pour avis technique	01 jour	ADER
	08	Visa technique du DAC	5 -10 jours	ORE
	09	Lancement Appel à Candidature	15-30 jours	ADER
	10	Dépouillement, évaluation dossier	5-10 jours	ADER/MdE
	11	Choix permissionnaire/Concessionnaire	01 jour	ADER/MdE
12	Eventuellement négociation	05 jours	ADER/MdE/Opérateur	
REALISATION	13	Information, sensibilisation de la Commune et des futurs abonnés	3 jours	ADER
	14	Rédaction de la convention de partenariat		Commune /Opérateur
	15	Instruction du contrat d'autorisation	03 jours	ADER
	16	Délivrance du contrat d'autorisation	10-15 jours	MdE
	17	Signature de la convention de financement entre ADER et opérateur	05 jours	ADER /Opérateur
	18	Visa CDE	15 jours	CDE
	19	Notification de l'opérateur (Ordre de Service)	01 jour	ADER
	20	Livraison des matériels (s'il y en a)	01 jour	ADER
	21	Paiement de l'acompte de la subvention	10-15 jours	ADER
	22	Démarrage des travaux	02-03 jours	ADER/Opérateur
	23	Suivi de l'avancement des travaux		ADER/Commune
	24	Demande de réception technique		ADER/Opérateur
	25	Réception technique		ADER/MdE/ORE /Opérateur
	26	Branchement des clients	720 jours/ continue	Opérateur
	27	Décompte Générale Définitif (DGD)		ADER/Opérateur /Commune
	28	Clôture de la convention de financement		ADER
	29	Délivrance du certificat de conformité		MdE/ADER
	30	Gestion de l'exploitation	Continue	Opérateur
	31	Suivi de l'exploitation	Continue	Commune/ADER/ORE/ MdE

Phase Sélection Opérateur

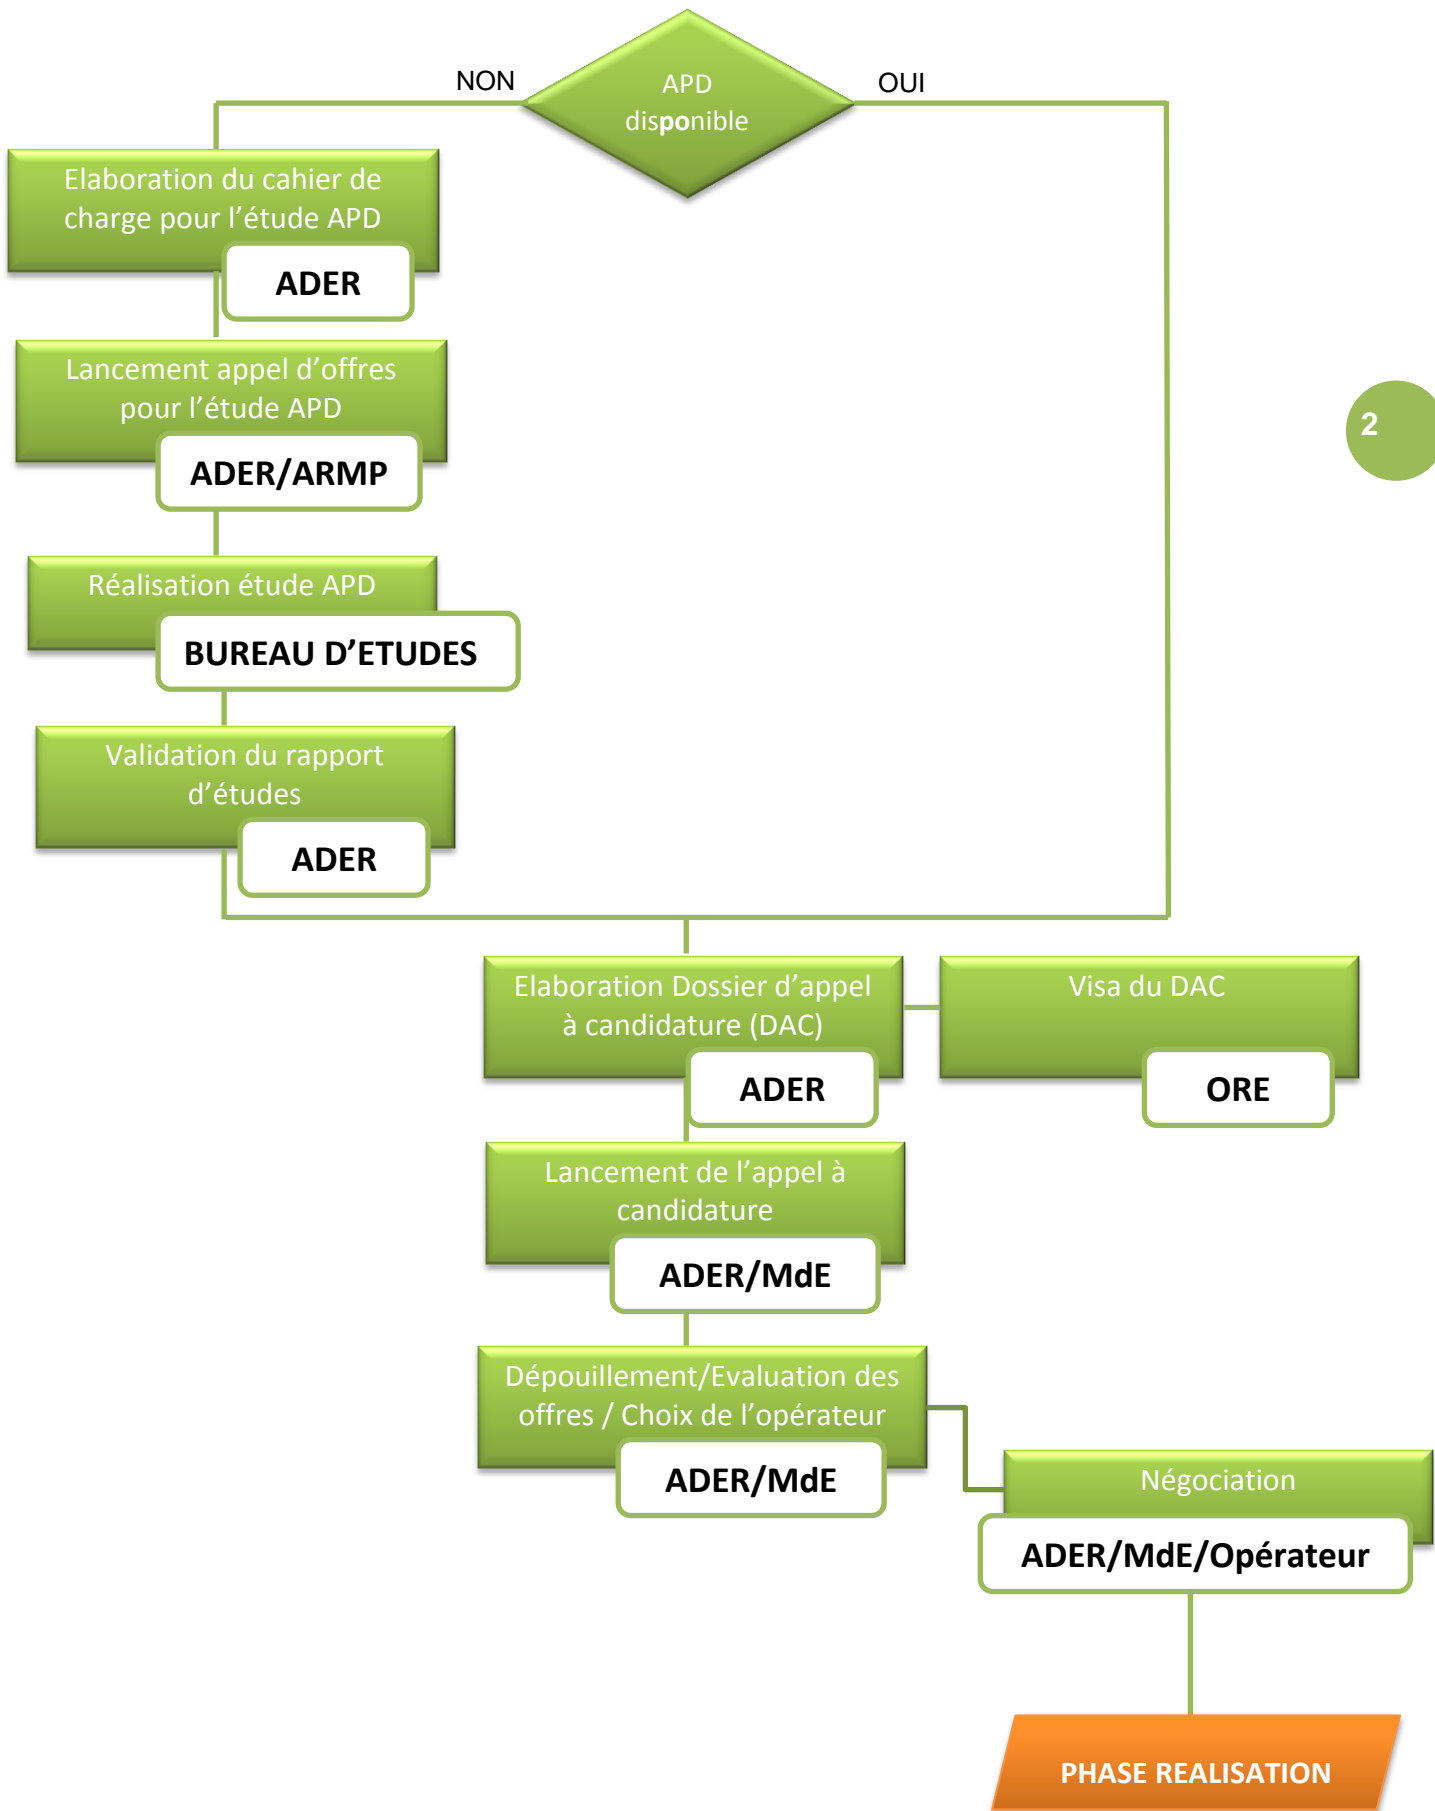

Phase Réalisation

